



Raportul auditului performanței  
atînse în cadrul proiectelor finanțate din fondurile externe gestionate prin  
intermediul Unității Consolidate de Implementare a Proiectelor Fondului  
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

***Echipa de audit:***

Tatiana Popa - șeful echipei de audit

***Membrii echipei de audit:***

Felicia Sârbu

Eugeniu Popa

***Responsabil de audit:***

Purici Svetlana

Direcția generală de audit III

09.12.2021



# Temeiul efectuării și scopul auditului

## ✓ **Misiunea de audit a fost realizată în temeiul:**

- Art.31 și art.32 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova
- Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021

## ✓ **Scopul auditului**

- evaluarea performanțelor atinse în procesul implementării Programelor IFAD VI și IFAD VII pe parcursul anilor 2015-2021 (10 luni)

## ✓ **Obiectivele specifice de audit:**

1. Au fost atinși indicatorii de rezultat stabiliți de Proiectele IFAD?
2. Investițiile efectuate în cadrul Proiectelor IFAD au întrunit criteriile de durabilitate și sustenabilitate?



# Informație privind debursările efectuate în cadrul proiectelor IFAD VI și IFAD VII


mil. unități monetare

Donator	Un.măs	Conform acordului			Debursat			Sold nedebersat		
		Total	împrumut	grant	Total	împrumut	grant	Total	împrumut	grant
<b>IFAD VI „Proiectul Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Agriculturii” (2015 – 2021), finalizat</b>										
IFAD	DST	10,8	10,5	0,33	10,6	10,4	0,17	0,3	0,1	0,15
GEF	USD	4,3	-	4,3	3,9	-	3,9	0,4	-	0,4
DANIDA	DKK	28,6	-	28,6	28,6	-	28,6	0,0	-	0,0
<b>IFAD VII „Proiectul de Reziliență Rurală” (2017 – 2021 (10 luni)), în derulare până în anul 2023</b>										
IFAD	USD	18,7	18,2	0,5	9,5	9,4	0,1	9,2	8,8	0,4
ASAP	USD	5,0	-	5,0	1,9	-	1,9	3,1	-	3,1




# Sinteza utilizării resurselor externe sub aspectul Componentelor

**IFAD VI**  
**„Proiectul Servicii Financiare Rurale  
și Dezvoltarea Agriculturii”**

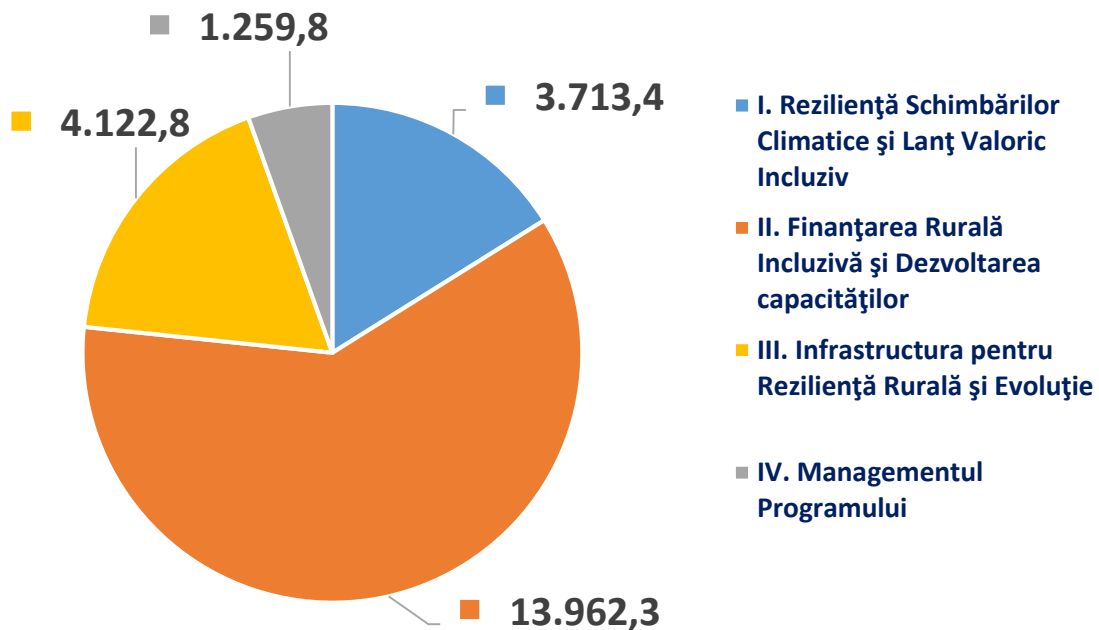

**IFAD VII**  
**„Proiectul de Reziliență Rurală”**

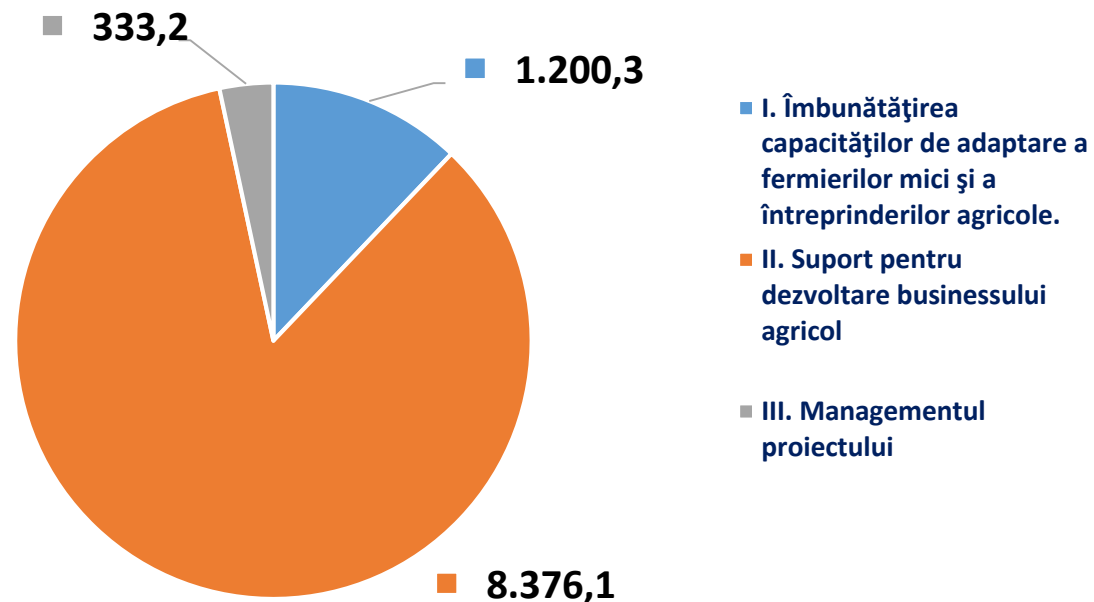



# Sinteza unor rezultate obținute în cadrul realizării proiectelor IFAD VI și IFAD VII

Nr. d/o	Indicatorii	Un. măsură	IFAD VI	IFAD VII	TOTAL
1	Drumuri de acces construite	nr	20	1	21
2		km	28,5	1,7	30,2
3	Piețe rurale	nr	5	-	5
4	Poduri	nr	4	-	4
5	Rețele de aprovizionare cu apă	nr	1	-	1
6	Sisteme de irigare	nr	1	2	3
7		ha	104	160	264
8	Perdele forestiere de protecție	nr	42	4	46
9		ha	313,0	28,3	341,3
10	Învelișuri de iarbă restabilite	ha	193,0	46,2	239,2
11	Școli de câmp	nr	11	-	11
12	Pepiniere private	nr	5	-	5
13	Împrumuturi acordate ÎMM	nr	125	49	174
14	Împrumuturi acordate tinerilor antreprenori	nr	451	25	476
15	Împrumuturi acordate micro-antreprenorilor, membrii AEÎ	nr	787	15	802
16	Beneficiarii granturilor acordate pentru tehnica agricolă de lucrare minimă a solului	nr	123	79	202
17	Beneficiari instruiți în dezvoltarea lanțului valoric	nr	378	175	553
18	Beneficiari instruiți în educația financiară	nr	2044	208	2252



## Nerealizarea unor indicatori de rezultat și imobilizarea pe un termen nedeterminat a 22,5 mii dolari SUA

- ✓ Indicatorii de rezultat aprobați inițial nu au fost supuși revizuirii periodice pe măsura atingerii țintelor stabilite, generând supraîndeplinirea sau neîndeplinirea lor semnificativă, ceea ce a făcut imposibilă evaluarea eficacității utilizării resurselor financiare alocate în scopurile predestinate;
- ✓ Unii indicatori nu au fost realizați, nefiind creați:
  - Laboratorul de testare a solului;
  - Fondului de garantare a creditelor în agricultură;
- ✓ Au fost imobilizate pe un termen nedeterminat și cu risc sporit de nerecuperare **22,5 mii dolari SUA** destinate dezvoltării unui soft de management integrat în vederea gestionării proiectelor administrate de UCIP IFAD.





Efectuarea investițiilor în sumă de 163,9 mii dolari SUA în obiective care nu sunt funcționale

Rețea de aprovizionare cu apă pentru irigare cu lungimea de 2 km satul Hîrtop, raionul Cimișlia





# Neluarea la evidență și neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra sectoarelor de drumuri publice locale nou create

## Neluarea la evidență a obiectelor de infrastructură construite din sursele IFAD

Sectorului de drum cu lungimea de 0,57 din comuna Dîngeni, raionul Ocnîța	2,6 mil. lei
Sectorului de drum cu lungimea de 2,75 km din orașul Hîncești	4,3 mil. lei
<b>Impactul:</b> <b>1. Neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra sectoarelor de drumuri publice locale nou create</b> <b>2. Diminuarea a valorii patrimoniului gestionat primăriei</b>	<b>6,9 mil. lei</b>







## Întreținerea necorespunzătoare a 7,5 ha de perdele forestiere, comuna Găvănoasa, raionul Cahul





Întreținerea necorespunzătoare a podului cu drumul de acces către zonele de producere, satului Stolniceni, raionul Hîncești





## Întreținerea necorespunzătoare a segmentului de drum în varianta albă cu lungimea de 0,6 km, satul Mereșeuca, raionul Ocnița





Piața agricolă din satul Horești, raionul Ialoveni, finisată în decembrie 2020, nu a funcționat până la 21.11.2021





# Lipsa reglementărilor privitor la acordarea împrumuturilor din contul granturilor externe

## Rambursarea componentei de grant în cadrul Programului IFAD VI

mii lei

Cauza rambursării grantului	Numărul de beneficiari	Grant acordat	Grant restituit	Sold restant
Utilizarea contract destinației	3	360,0	360,0	-
Întârzieri la plata creditului	5	600,0	541,8	58,2
Diferența de curs valutar*	39	-	123,8	-
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>1025,6</b>	<b>58,2</b>

\* Diferența de curs pozitivă care a rezultat din fluctuațiile cursului valutar din momentul aprobării creditului și data efectivă de efectuare a plății în cazul în care contractul cu furnizorul este în valută.



Grantul restituit a fost inclus în componența mijloacelor circulante (fondul de rulment) ale Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă și utilizat pentru recreditarea ulterioară.

Utilizarea grantului rambursat în scopuri de recreditare ulterioară nu este reglementată nici de actele reglementare aferente activităților Proiectului IFAD VI, precum și nici de cadrul regulator bugetar.



## Modul de transmitere a sistemelor de irigare create în cadrul IFAD către primării

Dezvoltarea rețelelor de sisteme centrale de irigare **Roșcani-Gura Bîcului, comuna Telița, raionul Anenii Noi**

- ✓ o extensie a sistemului **central de irigare - Roșcani-Gura Bîcului;**
- ✓ segmentul cu lungimea de 3,76 km în valoare de 2,7 mil. lei, construit din sursele IFAD care a fost transmis după darea în exploatare Primăriei Telița;
- ✓ la momentul de față sistemului central de irigare - Roșcani-Gura Bîcului are 2 proprietari: Agenția „Apele Moldovei” și Primăriei Telița, raionul Anenii Noi;
- ✓ nu există un contract de utilizare a sistemului de irigare dintre Primăriei Telița și Asociația Utilizatorilor de Apă Telița;
- ✓ proprietatea publică a APL este utilizată de persoane terțe din sectorul privat fără contract și fără plată.


12/9/2021

Construcția unui sistem de irigare de scară mică în comuna Saharna Nouă, raionul Rezina, care nu este conectat la sistemele centrale de irigare

- ✓ sistemul de irigare de scară mică construit din mijloacele Programului IFAD a fost transmis în comodat unui agent economic din domeniul agriculturii;
- ✓ contractul de comodat nu prevede responsabilități nici pentru comodatari nici pentru comodant, precum și prevederi privind efectuarea supravegherii tehnice a sistemelor de irigare transmise în folosință gratuită, precum și monitorizarea modului de utilizare a acestora, condițiile de restituire a bunului, nefiind întocmit nici actul de primire-predare în comodat a bunului respectiv;
- ✓ primăria urma să perceapă plata atât pentru utilizarea sistemului de irigare, cât și pentru arenda terenului:



# Deficinețe remediate pe parcursul misiunii de audit

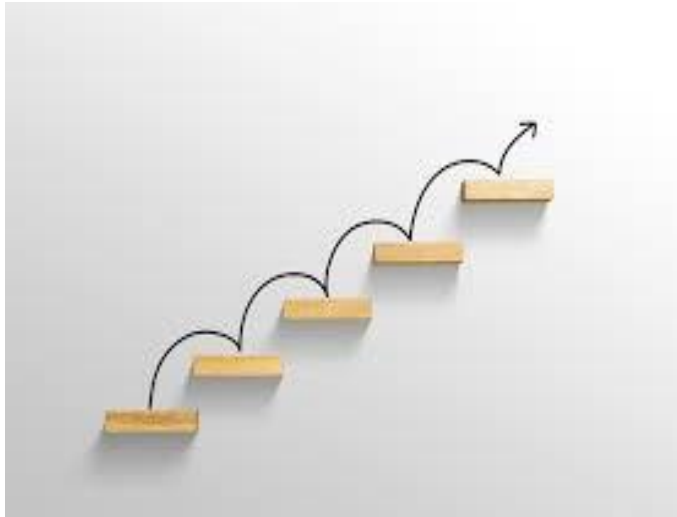

- UCIP IFAD a restabilit în evidența contabilă creanța de 22,5 mii dolari SUA (echivalent a 413,5 mii lei), precum și penalitățile și costurile de judecată, care urmează a fi încasate de la S.R.L. „Web Total Platform” în baza hotărârii de judecată; precum și s-a adresat în luna octombrie curent în instanța de judecată în vederea obligării antreprenorului „Lăcătuș” SRL de a remedia viciile aferente construcției rețelei de aprovizionare cu apă pentru irigare cu lungimea de 2 km din satul Hîrtop, raionul Cimișlia;
- Primăria comunei Găvănoasa, raionul Cahul a inițiat activitățile de completare a golurilor cu speciile indicate în schema de plantare în cadrul fâșiei forestiere plantate din sursele IFAD.
